



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Boletim
122315
cedido
232159811*


LAUDO DE MEDIÇÃO 01 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 17,35% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 417.515,59 (Quatrocentos e Dezessete Mil Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Centro 01 - Valor em Contrato R\$ 2.406.780,46

RUA	VALOR MEDIDO R\$		
Aloísio Guimarães			
Prefeito José Grande			
Gonçalves Dias			
Manoel Mendes de Camargo			
Miguel Adur Filho	R\$ 65.168,41		
Pioneiro Rovedo Ziegman	R\$ 70.741,94		
Anita Garibaldi	R\$ 163.860,89		
Euclides da Cunha			
Anibal Ziegman			
José Klosowski	R\$ 81.366,80		
Henrique Michalak	R\$ 36.377,55	% da Medição	% Acumulada
TOTAL	R\$ 417.515,59	17,35 %	17,35 %

Pitanga, 20 de Março de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	TOTAL: 2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	2.404.395,64	-	17,27	17,27	-	415.130,77	415.130,77
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	20.879,17	-	20,00	20,00	-	4.175,83	4.175,83
1.2.2.	BASE E SUB BASE	20.879,17	-	20,00	20,00	-	4.175,83	4.175,83
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	921.525,80	-	20,00	20,00	-	184.305,15	184.305,15
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	-	20,00	20,00	-	33.249,65	33.249,65
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	123.244,46	-	20,00	20,00	-	24.648,89	24.648,89
1.2.2.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	-	20,00	20,00	-	8.265,27	8.265,27
1.2.2.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	-	20,00	20,00	-	106.045,82	106.045,82
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	-	20,00	20,00	-	12.095,52	12.095,52
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,62	-	18,89	18,89	-	35.701,43	35.701,43
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	-	20,00	20,00	-	32.373,82	32.373,82
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	-	20,00	20,00	-	3.327,61	3.327,61
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.525,47	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	677.528,08	-	10,00	10,00	-	67.752,82	67.752,82
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	9.565,66	-	10,00	10,00	-	956,57	956,57
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	292.981,19	-	10,00	10,00	-	29.298,12	29.298,12
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	-	10,00	10,00	-	7.095,85	7.095,85
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	-	10,00	10,00	-	8.907,44	8.907,44
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	-	10,00	10,00	-	7.524,90	7.524,90
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	-	10,00	10,00	-	3.095,91	3.095,91
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	-	10,00	10,00	-	1.889,49	1.889,49
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	-	10,00	10,00	-	4.902,13	4.902,13
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	-	10,00	10,00	-	2.369,47	2.369,47

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	-	10,00	10,00	-	321,21	321,21	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	13.917,31	-	10,00	10,00	-	1.391,73	1.391,73	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	153.612,19	-	65,00	65,00	-	99.847,92	99.847,92	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,9 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	9.351,17	-	65,00	65,00	-	6.078,26	6.078,26	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.716,26	-	65,00	65,00	-	1.765,57	1.765,57	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8.472,45	-	65,00	65,00	-	5.507,09	5.507,09	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	75.140,48	-	65,00	65,00	-	48.841,31	48.841,31	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15.175,52	-	65,00	65,00	-	9.864,09	9.864,09	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	-	65,00	65,00	-	27.595,48	27.595,48	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	-	65,00	65,00	-	196,12	196,12	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "2" M	17.948,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:						
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RR-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	16.734,94	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	233.476,16	-	10,00	10,00	-	23.347,62	23.347,62
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	-	10,00	10,00	-	838,39	838,39
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	-	10,00	10,00	-	1.173,75	1.173,75
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	-	10,00	10,00	-	8.960,91	8.960,91
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	-	10,00	10,00	-	642,09	642,09
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	96.712,85	-	10,00	10,00	-	9.671,29	9.671,29
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	20.611,92	-	10,00	10,00	-	2.061,19	2.061,19

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 20 de março de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RR: 0

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	TOTAL: 1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	1.830.454,93	-	38,63	38,63	-	707.019,29	707.019,29
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	15.912,79	-	90,00	90,00	-	14.321,51	14.321,51
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	15.912,79	-	90,00	90,00	-	14.321,51	14.321,51
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	702.332,12	-	55,71	55,71	-	391.249,45	391.249,45
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	126.704,17	-	90,00	90,00	-	114.033,75	114.033,75
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	93.929,03	-	90,00	90,00	-	84.536,13	84.536,13
1.2.2.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	31.496,36	-	40,00	40,00	-	12.598,54	12.598,54
1.2.2.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	404.110,33	-	40,00	40,00	-	161.644,13	161.644,13
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	46.092,23	-	40,00	40,00	-	18.436,89	18.436,89
1.2.3.1.	MEIO FIO	131.689,54	-	75,54	75,54	-	99.473,64	99.473,64
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOÇO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	108.306,79	-	80,00	80,00	-	86.645,43	86.645,43
1.2.3.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOÇO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.035,27	-	80,00	80,00	-	12.828,21	12.828,21
1.2.4.	CAIACAO EM MEIO FIO	7.347,49	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	550.601,50	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	14.037,28	-	-	-	-	-	-
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	221.340,95	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	92.038,01	-	-	-	-	-	-
1.2.4.5.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	66.795,45	-	-	-	-	-	-
1.2.4.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52.008,25	-	-	-	-	-	-

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APelido do Empreendimento 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Orçamento Contratado								
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		1.832.839,76	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	21.396,77	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13.058,85	-	-	-	-	-	-
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33.880,87	-	-	-	-	-	-
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	-	-	-	-	-	-
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	-	-	-	-	-	-
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	6.438,63	-	-	-	-	-	-
1.2.5. SINALIZAÇÃO		45.855,54	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-
1.2.6. DRENAGEM		101.223,98	-	80,00	80,00	-	80.979,18	80.979,18
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	6.912,19	-	80,00	80,00	-	5.529,75	5.529,75
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.900,83	-	80,00	80,00	-	1.520,66	1.520,66
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.928,83	-	80,00	80,00	-	4.743,06	4.743,06

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	28.123,93	-	80,00	80,00	-	22.499,15	22.499,15	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36.697,70	-	80,00	80,00	-	29.358,16	29.358,16	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	-	80,00	80,00	-	17.328,40	17.328,40	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITTOAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.649,29	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.846,92	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.867,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.264,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.866,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	-	65,00	65,00	-	120.995,50	120.995,50	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	-	65,00	65,00	-	4.344,62	4.344,62	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	9.357,64	-	65,00	65,00	-	6.082,46	6.082,46	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	71.444,79	-	65,00	65,00	-	46.439,12	46.439,12	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	-	65,00	65,00	-	3.327,34	3.327,34	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	77.108,57	-	65,00	65,00	-	50.120,57	50.120,57	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019		EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 1	
CNPJ 00.481.987/0001-03		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900					

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
				Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
TOTAL:				38,71	38,71	709.404,11	709.404,11
1.2.9.6.		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	16.432,92	-	65,00	10.681,40	10.681,40

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

sexta-feira, 20 de março de 2020

Data

Responsável Técnico para Fiscalização
 Nome: Edson José Marques Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-89854/D
 ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 - MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 20 de Março de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 024/2020

Pitanga, 27 de Março de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	399.353,67		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		399.353,67	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03



Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente Geral
Matr. 109.784-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20200000000652</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">df5a4ad8b</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">PITANGA/PR</h2>
---	---	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço:			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA		UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000			
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
		Fone *****	
		Cidade *****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 292.260,91 Mão de obra R\$ 125.254,68 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 13.778,01 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 4.383,91 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 80.002.03128/71	417.515,59	3,50	4.383,91	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	125.254,68	4.383,91	0,00	292.260,91		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
417.515,59		399.353,67					

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 20200000000650.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4960,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$18846,75; Total Aprox: R\$21806,84. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$13.778,01



Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:20:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFS-e.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 20200000000652 Competência 26/03/2020 Cód. Verificação NFS-e df5a4ad8b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:20:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFS-e.Portal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR
 DATA: 30/03/2020 #HORA: 17:06:31
 TERMINAL: 1101 NSU: 000466 AUT.: 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.788-2
 NOME: TAPALAM CONSTRUCOES LTDA
 DEPOSITANTE:
 REF OF 024/2020 - PM DE PITANGA


VALOR TOTAL: 399.353,67
 VALOR DINHEIRO: 399.353,67

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

26/03/2020


GPS - Guia da Previdência Social


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	13.778,01	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.778,01	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19463003201620784000477 13.778,01RD1101 N.ID: 00900020312671 COD.FRG: 2656 CBMP: 032020

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000652</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26/03/2020</td> <td style="text-align: center;">df5a4ad8b</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	26/03/2020	df5a4ad8b
Data do Serviço	Código Verificador					
26/03/2020	df5a4ad8b					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/03/2020	Exigível	PITANGA/PR



TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01, Concorrência n. 04/2019, Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 292.260,91 Mão de obra R\$ 125.254,68 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 13.778,01 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 4.383,91 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	417.515,59	3,50	4.383,91	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descostos	
0,00		125.254,68		4.383,91		292.260,91	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
417.515,59				399.353,67			

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000650. Lei 12741/2012: Mun: R\$4960,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$16846,75; Total Aprox: R\$21806,84. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$13.778,01	 Alisson Rodrigo Renczenzen Comissão de Recebimento CPF: 030.030.189-50 - RG: 10.205.117-1
	

Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:20:18.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000652df5a4ad8b00481987000103



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 27/04/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	103	3	4.383,91	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - MARÇO/2020 - NFS-e DE Nº 202000000000652 - CONTRATO Nº 430/2019 -											

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12000000000061202	27/04/2020	4.383,91
Autenticação - via contribuinte: CEI19463003201640790000480 4.383,91RD1101						

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4112 / 2020

Credor: 0000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13022 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	127.116,08	20.875,78	20.875,78

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 20.875,78Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades -
Mobilidade Urbana - CEF-626.2.2509.2017

710496

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 20.875,78 (vinte mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de março de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13022 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 30/03/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	
Valor do Empenhado 127.116,08	Saldo Anterior do Empenho 127.116,08
Valor Liquidado 20.875,78	Saldo Atual do Empenho 106.240,30

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035.232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97
 CONTRA PARTIDA DO RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	127.116,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	652	20.875,78	Outras Sér	26/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 20.875,78

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 4041 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13023 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	2.279.664,38	396.639,81	378.477,89

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

13.778,01

4.383,91

Total Retenções:**18.161,92****TOTAL DA ORDEM: 378.477,89****Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades -
Mobilidade Urbana-CEF-626.2.2509.2017****710496**

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 378.477,89 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de março de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13023 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 30/03/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.279.664,38	Saldo Anterior do Empenho 2.279.664,38	Valor Liquidado 396.639,81	Saldo Atual do Empenho 1.883.024,57

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	2.279.664,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	652	396.639,81	Outras Sér	26/03/2020

Valor Liquido a Pagar : 396.639,81


Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar

Favoritos

RE: NFSe_Tapalam

Lixo Eletrônico 24

Tapalam <tapalam@uol.com.br>
Sex, 27/03/2020 11:09
Você



Caixa de Entrada 1664

Adicionar aos favoritos

Sra. Daniele

Vou informar duas contas da empresa Tapalam.

Pastas

Caixa de Entrada 1664

Caixa Econômica Federal
Agência 0379
Op. 003
Conta corrente 1708-2

Lixo Eletrônico 24

Rascunhos 69

Banco Brasil
Agência 0355-7
Conta corrente 25070-8

Itens Enviados

Muito obrigado,

Itens Excluídos


Tapalam Const. e Emp. Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Gerente administrativo
(43) 3424-1200 (43) 99974-0474


Arquivo Morto

Anotações


Histórico de Conversa

Nova pasta



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	13.778,01	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	13.778,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	13.778,01	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	13.778,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000650</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">962ca3eba</h2>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 375.764,03 Mão de obra R\$ 41.751,56 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 4.592,67 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.461,30 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	417.515,59	3,50	1.461,30	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		41.751,56		1.461,30		375.764,03	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
417.515,59				411.461,62			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1653,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$5615,58; Total Aprox: R\$7268,94. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$4.592,67	
---	---


Consulta realizada em 26/03/2020 às 15:19:57.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal




202000000000650962ca3eba00481987000103

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	4.592,67	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.592,67	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	4.592,67	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	4.592,67	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:30 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: **C87D.5222.4881.9CAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 26/03/2020 15:38:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Optantes

Data da consulta: 27/03/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matríz

CNPJ : 00.481.987/0001-03

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Voltar](#)


[Gerar PDF](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.481.987/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/1995
NOME EMPRESARIAL TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TAPALAM		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CONTORNO SUL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 241
CEP 86.810-465	BAIRRO/DISTRITO VILA RURAL NOVA UKRANIA	MUNICÍPIO APUCARANA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (43) 3422-1471
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2020 às 09:29:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

7130



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 27/04/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	103	3	4.383,91	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - MARÇO/2020 -
NFS-e DE Nº 202000000000652 -
CONTRATO Nº 430/2019 -

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000061202	27/04/2020	4.383,91

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 27/04/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
27/03/2020	12000000000061202	27/04/2020
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
	4.383,91	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$
	0,00	4.383,91

8165000043-4 | 83913362202-8 | 00427120000-0 | 00000061202-8

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Boi lata
122404*

*cod. 99
2341906*

LAUDO DE MEDIÇÃO 02 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 26,53% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$221.083,59 (Duzentos e Vinte e Um Mil Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Centro 01 - Valor em Contrato R\$ 2.406.780,46

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Aloísio Guimarães		
Prefeito José Grande		
Gonçalves Dias		
Manoel Mendes de Camargo		
Miguel Adur Filho	R\$ 12.094,17	
Pioneiro Rovedo Ziegman	R\$ 19.249,39	
Anita Garibaldi	R\$ 189.740,03	
Euclides da Cunha		
Anibal Ziegman		
José Klosowski		
Henrique Michalak		% Acumulada
TOTAL	R\$ 221.083,59	26,53 %

Pitanga, 07 de Maio de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

Ofício nº: 48/2020

PITANGA/PR, 07 de maio de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0503385-07

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 2.286.441,44	R\$ 210.029,41	R\$ 606.669,22
Contrapartida Financeira:	R\$ 120.339,02	R\$ 11.054,18	R\$ 31.929,96
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.406.780,46	R\$ 221.083,59	R\$ 638.599,18
Execução Física:	-	9,19%	26,53%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 120.339,02	INVESTIMENTO 2.535.544,09	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) 128.763,63	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	2	2.406.780,46	417.515,59	221.083,59	638.599,18	26,53%
					(%)		(100,00%)	(17,35%)	(9,19%)	(26,53%)	
					Financiamento		2.286.441,44	396.639,81	210.029,41	606.669,22	
					Contrapartida		120.339,02	20.875,78	11.054,18	31.929,96	26,53%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.406.780,46	417.515,59	221.083,59	638.599,18	

Acumulado Anterior: 17,35%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

quinta-feira, 7 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020	Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 26,53%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.405.780,46	17,35	9,19	26,53	417.515,59	221.083,59	638.599,18
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 8050.2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 6 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	10,00	10,76	20,76	321,21	345,62	666,83	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	13.917,31	10,00	10,76	20,76	1.391,73	1.497,50	2.889,23	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	153.612,19	65,00	-	65,00	99.847,92	-	99.847,92	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	9.351,17	65,00	-	65,00	6.078,26	-	6.078,26	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.716,26	65,00	-	65,00	1.765,57	-	1.765,57	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8.472,45	65,00	-	65,00	5.507,09	-	5.507,09	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	75.140,48	65,00	-	65,00	48.841,31	-	48.841,31	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15.175,52	65,00	-	65,00	9.864,09	-	9.864,09	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	65,00	-	65,00	27.595,48	-	27.595,48	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	65,00	-	65,00	196,12	-	196,12	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	17.948,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 26,53%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	17,35	9,19	26,53	417.515,59	221.083,59	638.599,18
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	16.734,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	233.476,16	10,00	40,00	50,00	23.347,62	93.390,47	116.738,09	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	10,00	40,00	50,00	838,39	3.353,58	4.191,97	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	10,00	40,00	50,00	1.173,75	4.695,00	5.868,75	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	10,00	40,00	50,00	8.960,91	35.843,64	44.804,55	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	10,00	40,00	50,00	642,09	2.568,34	3.210,43	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	96.712,85	10,00	40,00	50,00	9.671,29	38.685,14	48.356,43	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	20.611,92	10,00	40,00	50,00	2.061,19	8.244,77	10.305,96	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	NÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 26,53%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	17,35	9,19	26,53	417.515,59	221.083,59	638.599,18
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	2.406.780,46	17,35	9,19	26,53	417.515,59	221.083,59	638.599,18	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.404.395,64	17,27	9,19	26,46	415.130,77	221.083,59	636.214,36	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	20.879,17	20,00	1,16	21,16	4.175,83	242,20	4.418,03	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	20.879,17	20,00	1,16	21,16	4.175,83	242,20	4.418,03	
1.2.2.	BASE E SUB BASE	921.525,80	20,00	1,16	21,16	184.305,15	10.689,71	194.994,86	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	20,00	1,16	21,16	33.249,65	1.928,48	35.178,13	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	123.244,46	20,00	1,16	21,16	24.648,89	1.429,64	26.078,53	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	20,00	1,16	21,16	8.265,27	479,39	8.744,66	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	20,00	1,16	21,16	106.045,82	6.150,66	112.196,48	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	20,00	1,16	21,16	12.095,52	701,54	12.797,06	
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,62	18,89	23,20	42,09	35.701,43	43.859,20	79.560,63	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	20,00	24,57	44,57	32.373,82	39.771,24	72.145,06	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	20,00	24,57	44,57	3.327,61	4.087,96	7.415,57	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	10.525,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	677.628,08	10,00	10,76	20,76	67.752,82	72.902,01	140.654,83	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	9.565,66	10,00	10,76	20,76	956,57	1.029,26	1.985,83	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	292.981,19	10,00	10,76	20,76	29.298,12	31.524,78	60.822,90	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	10,00	10,76	20,76	7.095,85	7.635,13	14.730,98	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	10,00	10,76	20,76	8.907,44	9.584,40	18.491,84	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	10,00	10,76	20,76	7.524,90	8.096,78	15.621,68	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	10,00	10,76	20,76	3.095,91	3.331,20	6.427,11	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	10,00	10,76	20,76	1.889,49	2.033,10	3.922,59	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	10,00	10,76	20,76	4.902,13	5.274,69	10.176,82	
1.2.4.9.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM, PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	10,00	10,76	20,76	2.369,47	2.549,55	4.919,02	



MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 02 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.


Rua Anita Garibaldi

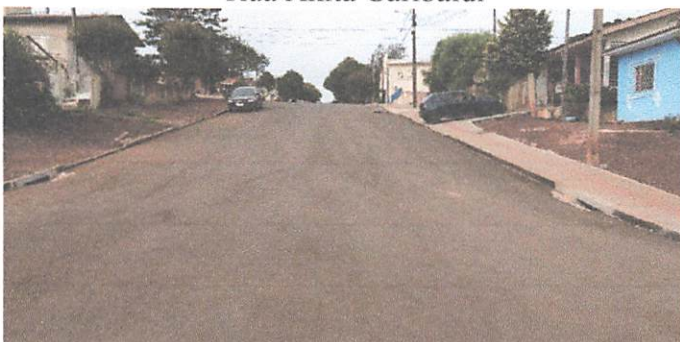

Rua Henrique Michalak



Rua José Klosoviski

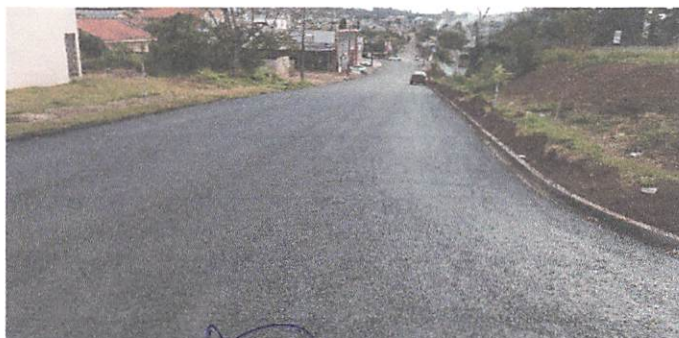




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


Rua Miguel Adur Filho

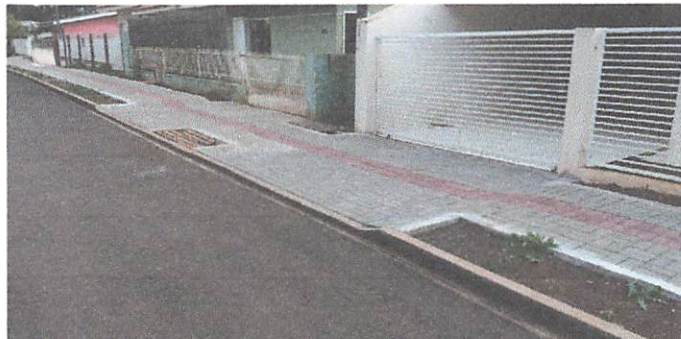

Rua Pioneiro Rovedo Zigmann




Pitanga, 07 de Maio de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241
 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA
 Município: APUCARANA - PR
 E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR
 Fone: (43) 3424-1200
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 00.481.987/0001-03 6360650721 380



Número da NFS-e

20200000000668

Data do Serviço
19/05/2020

Código Verific
c061cfa



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

19/05/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Município de Pitanga

PITANGA/PR

Endereço

Centro Administrativo 28 de Janeiro,171

Cidade

PITANGA

UF

PR

Fone

(42) 3646-1122

CEP

85200-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

76.172.907/0001-08

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Medição n. 02 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 154.758,51
 Mão de obra R\$ 66.325,08
 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 7.295,76
 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 2.321,38
 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71

221.083,59

3,50

2.321,38

Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

I OF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

66.325,08

Valor do ISSQN Retido

2.321,38

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

154.758,51

Valor Total da NFS-e

221.083,59

Valor Líquido da NFS-e

211.466,45

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$2626,47; Est: R\$0,00; Fed: R\$8920,72; Total Aprox: R\$11547,19. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$7.295,76

Dejalmo Sacon
 CPF 035.165.089-06
 RG 7.011.802-5

Alisson Rodrigo Renczke
 Comissão de Recebimento
 CPF 095.036.189-59 - RG 10.269.717-0



Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:42:38.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000668c061cfa6600481987000103

Recebi(emos) de

TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

20200000000668

Competência

19/05/2020

Cód. Verificação NFS-e

c061cfa66

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:42:38.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13022 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2020

Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 127.116,08	Saldo Anterior do Empenho 106.240,30	Valor Liquidado 11.054,18	Saldo Atual do Empenho 95.186,12

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	127.116,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	668	11.054,18	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 11.054,18

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13023 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2020

Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho
2.279.664,38	1.883.024,57
Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
210.029,41	1.672.995,16

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	2.279.664,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	668	210.029,41	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 210.029,41

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6311 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Banco: 0-CAIXA Agência: Conta:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13023 / 2019	2 / 2020	0 / 2.019,00	2.279.664,38	210.029,41	200.412,27

Histórico:

Retenções:

218810109	ISS	2.321,38
218810102	INSS	7.295,76

Total Retenções: 9.617,14**TOTAL DA ORDEM: 210.029,41****Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496**
CONTRATO 0503385-07/19

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 210.029,41 (duzentos e dez mil e vinte e nove reais e quarenta e um centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 27 de maio de 2020.

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda_____
OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6312 / 2020

Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Banco: 0-CAIXA Agência: Conta:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
13022 / 2019	2 / 2020	0 / 2.019,00	127.116,08	11.054,18	11.054,18

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 11.054,18

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946

710496

CONTRATO 0503385-07/19

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 11.054,18 (onze mil e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 27 de maio de 2020.

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda_____
OSVALDO RACHELLE
Controle Interno



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RETI	105 7	2.321,38	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 202000000000668
Contrato: 430/2019

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000064442	22/06/2020	2.321,38

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

21/05/2020

Informação para Baixa

12000000000064442

Data de Vencimento

22/06/2020

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

2.321,38

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$


2.321,38

8162000023-9 21383362202-9 00622120000-6 00000064442-7


Autenticação Mecânica



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	7.295,76	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	11 - TOTAL	7.295,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	7.295,76	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	11 - TOTAL	7.295,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:11:06 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2020.

Código de controle da certidão: **3E92.8703.8FFA.C244**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CE REGOV/PG 2041/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 02 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciell@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 22 de maio de 2020 09:07 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 02

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 210.029,41** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071049-6** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 11.054,18, totalizando R\$ 221.083,59.

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos

Serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais:

3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Goncalves Bottega
Coordenadora de Filial – SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



DRP CREDITO PARCELA 02- CT 0503385-07- PM PITANGA.pdf
13.8kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 045/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	211.466,45		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		211.466,45	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

GENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 045/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	211.466,45		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		211.466,45	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

- Outlook
- Novo mensagem
- Favoritos
- Pastas
- Caixa de Entrada 1794
- Lixo Eletrônico 48
- Rascunhos 76
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações
- Histórico de Conversa
- Nova pasta
- Grupos

Pesquisar

Responder Excluir Arquivar Mover para Categorizar

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS DE GUIAS DE RETENÇÕES

PMP Pagamento
Seg, 25/05/2020 10:41
Para: ag1946@caixa.gov.br

OFÍCIO 43.pdf 538 KB	OFÍCIO 44.pdf 533 KB
OFÍCIO 45.pdf 545 KB	OFÍCIO 46.pdf 541 KB

4 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja efetuada a transferência e pagamento das guias de retenções conforme instruções dos ofícios em anexo.

Pedimos por gentileza que seja efetuado ainda hoje e que nos encaminhem via e-mail o comprovante do respectivo pagamento, Obrigada!

OBS: A DÉBORA DA REGOV SOLICITOU QUE AS AUTENTICAÇÕES SEJAM FEITAS NA PARTE INFERIOR DOS COMPROVANTES E NÃO NAS LATERAIS, GRATA!

Att.

**Daniele Gomes Ziebarth
Setor Financeiro
Prefeitura Municipal de Pitanga**



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Boi loto
122702

LAUDO DE MEDIÇÃO 03 - Centro 01


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 31,36% executada até o momento. A medição 03 totaliza R\$116.092,70 (Cento e Dezesseis Mil Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos).

Cópia
2941917/11

Centro 01 - Valor em Contrato R\$ 2.406.780,46

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$2.384,82	
Aloisio Guimarães		
Manoel Mendes de Camargo		
Gonçalves Dias		
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur	R\$ 50.400,03	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 8.487,41	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski	R\$ 42.083,29	
Henrique Michalak	R\$ 12.737,15	% Acumulada
TOTAL	R\$ 116.092,70	31,36 %

Pitanga, 06 de Julho de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPRONTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,36%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	25,53	4,82	31,36	638.599,18	116.092,70	754.691,88
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	2.406.780,46	25,53	4,82	31,36	638.599,18	116.092,70	754.691,88	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.404.395,64	26,46	4,83	31,29	636.214,36	116.092,70	752.307,06	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	20.879,17	21,16	6,38	27,54	4.418,03	1.332,09	5.750,12	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	20.879,17	21,16	6,38	27,54	4.418,03	1.332,09	5.750,12	
1.2.2.	BASE E SUB BASE	921.525,80	21,16	6,38	27,54	194.994,86	58.793,34	253.788,20	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	21,16	6,38	27,54	35.178,13	10.606,64	45.784,77	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	123.244,46	21,16	6,38	27,54	26.078,53	7.862,99	33.941,52	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	21,16	6,38	27,54	8.744,66	2.636,62	11.381,28	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	21,16	6,38	27,54	112.196,48	33.828,62	146.025,10	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	21,16	6,38	27,54	12.797,06	3.858,47	16.655,53	
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,62	42,09	5,22	47,31	79.560,63	9.871,45	89.432,08	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	44,57	5,53	50,10	72.145,06	8.951,36	81.096,42	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	44,57	5,53	50,10	7.415,57	920,09	8.335,66	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.525,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	677.528,08	20,76	3,94	24,70	140.654,83	26.694,61	167.349,44	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	9.565,66	20,76	3,94	24,70	1.985,83	376,89	2.362,72	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	292.981,19	20,76	3,94	24,70	60.822,90	11.543,45	72.366,35	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	20,76	3,94	24,70	14.730,98	2.795,76	17.526,74	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	20,76	3,94	24,70	18.491,84	3.509,52	22.001,36	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	20,76	3,94	24,70	15.621,68	2.964,81	18.586,49	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	20,76	3,94	24,70	6.427,11	1.219,79	7.646,90	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	20,76	3,94	24,70	3.922,59	744,46	4.667,05	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	20,76	3,94	24,70	10.176,82	1.931,44	12.108,26	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	20,76	3,94	24,70	4.919,02	933,58	5.852,60	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,36%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	26,53	4,82	31,36	638.599,18	116.092,70	754.691,88
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	20,76	3,94	24,70	666,83	126,56	793,39	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	13.917,31	20,76	3,94	24,70	2.889,23	548,35	3.437,58	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	153.612,19	65,00	12,63	77,63	99.847,92	19.401,21	119.249,13	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	9.351,17	65,00	12,63	77,63	6.078,26	1.181,05	7.259,31	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.716,26	65,00	12,63	77,63	1.765,57	343,06	2.108,63	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8.472,45	65,00	12,63	77,63	5.507,09	1.070,07	6.577,16	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	75.140,48	65,00	12,63	77,63	48.841,31	9.490,24	58.331,55	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15.175,52	65,00	12,63	77,63	9.864,09	1.916,67	11.780,76	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	65,00	12,63	77,63	27.595,48	5.362,01	32.957,49	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	65,00	12,63	77,63	196,12	38,11	234,23	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	17.948,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,36%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	26,53	4,82	31,36	638.599,18	116.092,70	754.691,88
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	16.734,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	233.476,16	50,00	-	50,00	116.738,09	-	116.738,09	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	50,00	-	50,00	4.191,97	-	4.191,97	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	50,00	-	50,00	5.868,75	-	5.868,75	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	50,00	-	50,00	44.804,55	-	44.804,55	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	50,00	-	50,00	3.210,43	-	3.210,43	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	96.712,85	50,00	-	50,00	48.356,43	-	48.356,43	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	20.611,92	50,00	-	50,00	10.305,96	-	10.305,96	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-59054/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 120.339,02	INVESTIMENTO 2.535.544,09	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) 128.763,63	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	3	2.406.780,46	638.599,18	116.092,70	754.691,88	31,36%
					(%)		(100,00%)	(26,53%)	(4,82%)	(31,36%)	
					Financiamento		2.286.441,44	606.669,22	110.288,07	716.957,29	
					Contrapartida		120.339,02	31.929,96	5.804,63	37.734,59	31,36%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.406.780,46	638.599,18	116.092,70	754.691,88	

Acumulado Anterior: 26,53%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRR: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 03 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



MUNICÍPIO DE PITANGA


08-0001-28.272.907

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (43) 3846-1132 - FAX 3846-1132



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECIFE ASPALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa TAPAJAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº 4302019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.

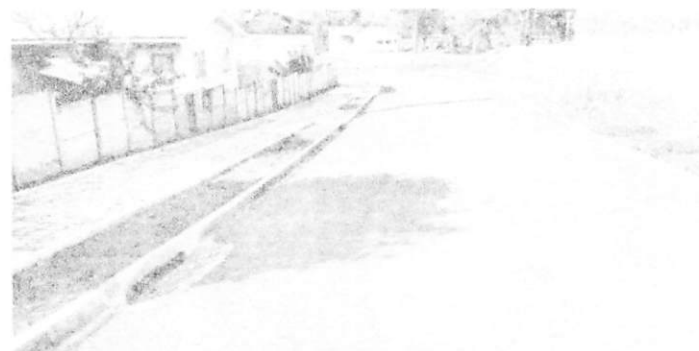




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.173.907/0001-08

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (45) 3648-1122 - FAX 3648-1172



Pitanga, 08 de Julho de 2020.

Eudson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PB

DATA: 31/07/2020

TERMINAL: 1100

NSU: 000757

HORA: 15:03:48

AUT.: 0044

PITANGA

14

Ministração e Finanças
-08

Contrato 28 de Janeiro, nº 171, Centro
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:31/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0374 001/00 001 708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUÇÕES LTDA

DEPOSITANTE:

PREF MUNIC DE PITANGA

VALOR TOTAL: 111.042,67

DEBITO AUTORIZADO: 111.042,67

CONSTRUÇÕES E

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Valor por Dívida

Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
1.218,97	NO.EX							

NFS-e 202000000000698

Contrato: 430/2019

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12000000000072487	31/08/2020	1.218,97

Autenticação - via contribuinte

CEF10453107200430790000750

1.218,97R01100



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.002.03128/7.1

TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº

PITANGA PR
CEP 85200-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/08/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

07/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

3.831,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.831,06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - VALOR INSS 2 - VALOR CONTRIBUINTE


CEF18463107200450784000762

3.831,06RD1100

N. 10: 00000203128/1 CDD. P. 05: 258 CDD. P. 05: 258 CDD. P. 07: 2020

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000698</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29/07/2020</td> <td style="text-align: center;">4ab7a5af6</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	29/07/2020	4ab7a5af6
Data do Serviço	Código Verificador					
29/07/2020	4ab7a5af6					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	29/07/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 03 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01, Concorrência n. 04/2019, Contrato n. 430/2019, Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 81.264,89 Mão de obra R\$ 34.827,81 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 3.831,06 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.218,97 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	116.092,70	3,50	1.218,97	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Primária	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	34.827,81	1.218,97	0,00	81.264,89		
Valor Total da NFS-e	116.092,70			Valor Líquido da NFS-e	111.042,67		

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1379,18, Est: R\$0,00; Fed: R\$4684,34; Total Aprox: R\$6063,52. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$3.831,06	
---	---



Consulta realizada em 29/07/2020 às 11:36:26.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000006984ab7a5af600481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 85810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">20200000000668</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verifica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19/05/2020</td> <td style="text-align: center;">c061cfa</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verifica	19/05/2020	c061cfa
Data do Serviço	Código Verifica					
19/05/2020	c061cfa					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - c061.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA		UF	Fonte					CEP	
		PR	(42) 3646-1122					85200-000	
Inscrição Municipal Inscrição Estadual									
Nome Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETN
Medição n. 02 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01, Concorrência n. U4/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 154.758,51 Mão de obra R\$ 86.325,08 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 7.285,76 Retenção 3,6% ISS sobre mão de obra R\$ 2.321,38 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	221.083,59	3,50	2.321,38	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

IMP	COP/INS	COP/INS Reparações	ICMS	ICF	IMI	IR/PASEP	IR/PASEP Impost.
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Nota Fiscal Bruta	Valor do ISSQN Pátrio	Base do ICMS ISSQN Pátrio	Valor do ISSQN Pátrio	Valor Total do ISSQN	Valor da Nota Fiscal Líquida		
0,00	0,00	66.325,08	2.321,38	0,00	154.758,51		
Valor Total da NFS-e	221.083,59			Valor Líquido da NFS-e	211.466,45		

Informações Adicionais Lot 12741/2012; Mun: R\$2826,47; Est: R\$0,00; Fed: R\$8920,72; Total Aprox: R\$11547,19. Fonte: IBRT. Retenção Previdência Social: R\$7.295,75 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Dejalmo Jacón</i></p> <p>CPF 035.165.089-06</p> <p>RG 7.011.802-5</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Alisson Rodrigo</i></p> <p>CPF 096.006.188-59 - RG 10.268.717-0</p> </div> </div>	
---	---

Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:42:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recob(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 20200000000668 Competência 19/05/2020 Cód. Verificação NFS-e c061cfa66	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:42:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13023 / 2019 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 4/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.279.664,38	1.672.995,16	110.288,07	1.562.707,09

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2	2.279.664,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	698	110.288,07	Outras Sér	29/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 110.288,07

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13022 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 3 / 2020

Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 127.116,08	Saldo Anterior do Empenho 95.186,12	Valor Liquidado 5.804,63	Saldo Atual do Empenho 89.381,49

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	127.116,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	698	5.804,63	Outras Sér	29/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 5.804,63

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9188 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13023 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	2.279.664,38	110.288,07	105.238,04

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

3.831,06

218810109

ISS

1.218,97

Total Retenções:**5.050,03****TOTAL DA ORDEM: 105.238,04****Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946****710496****CONTRATO 0583385-07/19**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
 Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9189 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13022 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	127.116,08	5.804,63	5.804,63

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 5.804,63**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946****710496****CONTRATO 0599385-07/19**

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controlador Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>1 - NOME DE RAZÃO SOCIAL (ONDE ENDEREÇO) CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	3.831,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
<p>ATENÇÃO: Vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATIM MULTA E JUROS	0.00
		11 - TOTAL	3.831,06
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>1 - NOME DE RAZÃO SOCIAL (ONDE ENDEREÇO) CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	3.831,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
<p>ATENÇÃO: Vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATIM MULTA E JUROS	0.00
		11 - TOTAL	3.831,06
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida		
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas
2020	486 ISSQN RETI	107 12			
Valor Situação			Valor Situação		
1.218,97 NO.EX					

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000698
Contrato: 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000072487	31/08/2020	1.218,97

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 31/08/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão 30/07/2020	Informação para Baixa 12000000000072487	Data de Vencimento 31/08/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 1.218,97	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 1.218,97	

Autenticação Mecânica

81600000012-4 18973362202-2 00831120000-3 00000072487-2





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:17 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2020.

Código de controle da certidão: **6E84.6C7A.32B9.C7FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071909004774316200

Informação obtida em 23/07/2020 16:13:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 089/2020

Pitanga, 30 de Julho de 2020.


Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga


Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:


BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	111.042,67		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		111.042,67	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARELI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

recebido
30-7-20
Patricia Magalhães
Gerente Geral de Rede S.E.
115401

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000				5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
				6 - VALOR DO INSS	7.295,76
				7 -	
				8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	7.295,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 00500020312871 COD. PAB: 2658 COMP: 052020CEF19462605200120784000411 7.295,76RD1100



MUNICIPIO DE PITANGA
 Estado do Paraná
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Anucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RETI	105 7	2.321,38	NO EX						

Tomador Município de Pitanga
 DMS - maio/2020
 NFS - 2020000000000668
 Contrato: 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1200000000006442	22/06/2020	2.321,38
Autenticação - via contribuinte		CEF19462605200110790000398 2.321,38RDI100		



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 089/2020

Pitanga, 30 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	111.042,67		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		111.042,67	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MABLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Patricia Magalhães
C 115401
Gerente Geral de Rede S.E.

CEP: 85200-000
115.092.70P 1.100



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

27/05
pgto.

Ofício nº 045/2020

2ª via

Pitanga, 22 de Maio de 2020.


Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga


Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	211.466,45		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		211.466,45	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MAREI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

9.617,14F 1100

CEF1945265200100006000392



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Contrato
7822792
Codigo
245714511

LAUDO DE MEDIÇÃO 04 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 34,29% executada até o momento. A medição 04 totaliza R\$70.695,09 (Setenta Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos).

Centro 01 - Valor em Contrato R\$ 2.406.780,46

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 8.549,88	
Aloisio Guimarães	R\$ 15.662,74	
Manoel Mendes de Camargo		
Gonçalves Dias	R\$ 9.013,48	
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur	R\$ 9.367,25	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 9.367,25	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski	R\$ 9.367,25	
Henrique Michalak	R\$ 9.367,25	% Acumulada
TOTAL	R\$ 70.695,09	34,29 %

Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/09/2020	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 34,29%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	31,36	2,94	34,29	754.691,88	70.695,09	825.386,97
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	2.406.780,46	31,36	2,94	34,29	754.691,88	70.695,09	825.386,97	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.404.395,64	31,29	2,94	34,23	752.307,06	70.695,09	823.002,15	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	20.879,17	27,54	1,35	28,89	5.750,12	281,87	6.031,99	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	20.879,17	27,54	1,35	28,89	5.750,12	281,87	6.031,99	
1.2.2.	BASE E SUB BASE	921.525,80	27,54	1,35	28,89	253.788,20	12.440,61	266.228,81	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	27,54	1,35	28,89	45.784,77	2.244,36	48.029,13	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	123.244,46	27,54	1,35	28,89	33.941,52	1.663,80	35.605,32	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	27,54	1,35	28,89	11.381,28	557,91	11.939,19	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	27,54	1,35	28,89	146.025,10	7.158,09	153.183,19	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	27,54	1,35	28,89	16.655,53	816,45	17.471,98	
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,82	47,31	0,02	47,33	89.432,08	35,71	89.467,79	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	50,10	0,02	50,12	81.096,42	32,38	81.128,80	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	50,10	0,02	50,12	8.335,66	3,33	8.338,99	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.525,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	677.528,08	24,70	3,79	28,49	167.349,44	25.678,31	193.027,76	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	9.565,66	24,70	3,79	28,49	2.362,72	362,54	2.725,26	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	292.981,19	24,70	3,79	28,49	72.366,35	11.103,99	83.470,34	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	24,70	3,79	28,49	17.526,74	2.689,33	20.216,07	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	24,70	3,79	28,49	22.001,36	3.375,92	25.377,28	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	24,70	3,79	28,49	18.586,49	2.851,94	21.438,43	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	24,70	3,79	28,49	7.646,90	1.173,35	8.820,25	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	24,70	3,79	28,49	4.667,05	716,11	5.383,16	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	24,70	3,79	28,49	12.108,26	1.857,90	13.966,16	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	24,70	3,79	28,49	5.852,60	898,03	6.750,63	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
					Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 34,29%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	31,36	2,94	34,29	754.691,88	70.695,09	825.386,97
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMP (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	24,70	3,79	28,49	793,39	121,74	915,13	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	13.917,31	24,70	3,79	28,49	3.437,58	527,46	3.965,04	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	163.612,19	77,63	21,00	98,63	119.249,13	32.258,59	161.507,72	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	9.351,17	77,63	21,00	98,63	7.259,31	1.963,75	9.223,06	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	2.716,26	77,63	21,00	98,63	2.108,63	570,42	2.679,05	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	8.472,45	77,63	21,00	98,63	6.577,16	1.779,22	8.356,38	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	75.140,48	77,63	21,00	98,63	58.331,55	15.779,51	74.111,06	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	15.175,52	77,63	21,00	98,63	11.780,76	3.186,86	14.967,62	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MAGICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMP DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	77,63	21,00	98,63	32.957,49	8.915,46	41.872,95	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	77,63	21,00	98,63	234,23	63,37	297,60	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	17.948,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATA'S EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalim Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 34,29%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	31,36	2,94	34,29	754.691,88	70.695,09	525.356,97
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	16.734,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	233.476,16	50,00	-	50,00	116.738,09	-	116.738,09	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	50,00	-	50,00	4.191,97	-	4.191,97	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	50,00	-	50,00	5.868,75	-	5.868,75	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	50,00	-	50,00	44.804,55	-	44.804,55	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	50,00	-	50,00	3.210,43	-	3.210,43	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	96.712,85	50,00	-	50,00	48.356,43	-	48.356,43	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	20.611,92	50,00	-	50,00	10.305,96	-	10.305,96	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

terça-feira, 18 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-89054/D
 ART/RR: 0




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 04 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.

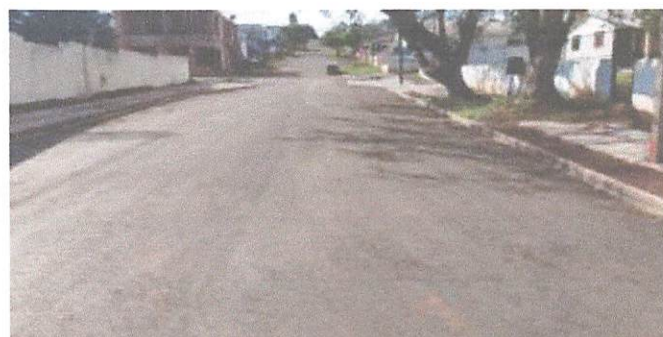


Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000718</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28/08/2020</td> <td style="text-align: center;">e5d7820a1</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	28/08/2020	e5d7820a1
Data do Serviço	Código Verificador					
28/08/2020	e5d7820a1					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/08/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 04 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 49.486,56 Mão de obra R\$ 21.208,53 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.332,94 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 742,30 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	70.695,09	3,50	742,30	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	21.208,53	742,30	0,00	49.486,56		

Valor Total da NFS-e	70.695,09	Valor Líquido da NFS-e	67.619,85
----------------------	-----------	------------------------	-----------


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$839,86; Est: R\$0,00; Fed: R\$2852,55; Total Aprox: R\$3692,41. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.332,94	
--	---

Consulta realizada em 28/08/2020 às 09:39:40.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000718e5d7820a100481987000103

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.332,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.332,94
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

T-VAL INSS P VA CONTRIBUI

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.332,94
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.332,94
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

T-VAL INSS P VA CONTRIBUI

5888	08/5050	90.005.03158/1	5.335,94	0,00	0,00	5.335,94	18:08:5050	0,00	0,00	5.335,94
<p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPZ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - Nº DE OBRIGADO SOCIAL - FONTE ENFERMO CEI 90.005.03158/1</p> <p>TAPAJUM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rãs Fernando Amaro e outras s/n PITANGA PR CEP 88500-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (R\$) 18:08:5050</p> <p>3 - IDENTIFICADOR 90.005.03158/1</p> <p>4 - VALOR DO IRRF 0,00</p> <p>5 - VALOR DO INSS 0,00</p> <p>6 - TOTAL 5.335,94</p> <p>ALTERNATIVO BAZA FRIA</p>										

5888	08/5050	90.005.03158/1	5.335,94	0,00	0,00	5.335,94	18:08:5050	0,00	0,00	5.335,94
<p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPZ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - Nº DE OBRIGADO SOCIAL - FONTE ENFERMO CEI 90.005.03158/1</p> <p>TAPAJUM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rãs Fernando Amaro e outras s/n PITANGA PR CEP 88500-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (R\$) 18:08:5050</p> <p>3 - IDENTIFICADOR 90.005.03158/1</p> <p>4 - VALOR DO IRRF 0,00</p> <p>5 - VALOR DO INSS 0,00</p> <p>6 - TOTAL 5.335,94</p> <p>ALTERNATIVO BAZA FRIA</p>										

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13023 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.279.664,38	1.562.707,09	67.160,34	1.495.546,75

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	2.279.664,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	718	67.160,34	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 67.160,34

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 11710 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13023 / 2019	4 / 2020	0 / 2019	2.279.664,38	67.160,34	64.085,10

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	2.332,94
218810109	ISS	742,30

Total Retenções: 3.075,24

TOTAL DA ORDEM: 64.085,10Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496
CONTRATO: 0503385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 18 de setembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR
DATA: 03/09/2020
TERMINAL: 1103

NSU: 000714

HORA: 16:25:07
AUT.: 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2
NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA
DEPOSITANTE:
PREF MUNIC PITANGA

VALOR TOTAL:
DEBITO AUTORIZADO:

67.619,85
67.619,85

0 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REÇO

ENTOS LTDA

8/09/2020

mento de receita de valor inferior ao
que resultar valor inferior deverá
lente nos meses subsequentes, até

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
6 - VALOR DO INSS	2.332,94
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.332,94

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



1911-12-11



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:30/09/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	108	12	742,30	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - agosto/2020
NFS-e 202000000000718
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------	---------------

12000000000075185

30/09/2020

742,30

Autenticação - via contribuinte

CEF19460309201680790000716

742,30RD1103



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080701181406228868

Informação obtida em 10/08/2020 14:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 109/2020

Pitanga, 01 de Setembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	67.619,85		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		67.619,85	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Ofício nº 109/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

CEFI94603092016550006000712 70.595,09F 1103

CE REGOV/PG 3603/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos -Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 08:46 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 04, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 3.534,75 e de financiamento é de R\$ 67.160,34, totalizando R\$ 70.695,09.

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71049-6 a contrapartida financeira no valor de R\$ 3.534,75 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.4 – Enviar Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) e Ofício corrigidos, com os valores executados acumulado corretos;

2.5- Alertamos que o prazo do cronograma de desembolso do contrato encerra em 31/08/2020. Se o desembolso não ocorrer até essa data, será necessário realizar a alteração do prazo de desembolso para posterior desembolso. Para tanto solicitamos que as providências sejam atendidas ainda hoje, 26/08/2020.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Calculo
122944
codigo
349712811*


LAUDO DE MEDIÇÃO 05 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 49,48% executada até o momento. A medição 05 totaliza R\$365.565,26 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 45.157,78	
Aloisio Guimarães	R\$ 114.073,84	
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 35.315,19	
Gonçalves Dias	R\$ 44.900,38	
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur	R\$ 105.464,27	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 16.896,08	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski		
Henrique Michalak	R\$ 3.757,72	% Acumulada
TOTAL	R\$ 365.565,26	49,48 %

Pitanga, 22 de Setembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO N° 287/2020

Pitanga, 09 de outubro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento Estratégicos e Central de Projetos


Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: Laudo Medição 05 – Centro 01 – Operação 0503385-07

Vimos através deste, encaminhar laudo de medição 05 – Centro 01 – Operação 0503385-07, no valor de R\$.365.565,26 (Trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) correspondente a 15,188...% da obra, que acumulada está em 49,48%.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



EVANDRO RANK MAZUR
Assessor de Planejamento
CPLAN – Município de Pitanga

Recebido em ___/___/___

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0/PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0/PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tabulam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 49,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	2.406.780,46	34,29	15,19	49,48	825.386,97	365.565,26	1.190.952,23
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.406.780,46	34,29	15,19	49,48	825.386,97	365.565,26	1.190.952,23
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	2.404.395,64	34,23	15,20	49,43	823.002,15	365.565,26	1.188.567,41
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	20.879,17	28,89	21,11	50,00	6.031,99	4.407,60	10.439,59
1.2.2.	BASE E SUB BASE	20.879,17	28,89	21,11	50,00	6.031,99	4.407,60	10.439,59
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	921.525,80	28,89	21,11	50,00	266.228,81	194.534,10	460.762,91
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	28,89	21,11	50,00	48.029,13	35.095,01	83.124,14
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	28,89	21,11	50,00	11.939,19	8.723,99	20.663,18
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	28,89	21,11	50,00	153.183,19	111.931,37	265.114,56
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	28,89	21,11	50,00	17.471,98	12.766,82	30.238,80
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,62	47,33	35,77	83,10	89.467,79	67.618,51	157.086,30
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	50,12	37,88	88,00	81.128,80	61.316,02	142.444,82
1.2.3.2.	LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	50,12	37,88	88,00	8.338,99	6.302,49	14.641,48
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.525,47	28,49	2,50	30,99	193.027,75	16.938,19	209.965,94
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	577.528,08	28,49	2,50	30,99	2.725,26	239,14	2.964,40
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	9.565,66	28,49	2,50	30,99	83.470,34	7.324,53	90.794,87
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	292.991,19	28,49	2,50	30,99	20.216,07	1.773,96	21.990,03
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	28,49	2,50	30,99	28.377,28	2.226,86	27.604,14
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	28,49	2,50	30,99			



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 49,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,46	34,29	15,19	49,48	825.386,97	365.565,26	1.190.952,23
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	28,49	2,50	30,99	21.438,43	1.881,22	23.319,65	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	28,49	2,50	30,99	8.820,25	773,98	9.594,23	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	28,49	2,50	30,99	5.383,16	472,38	5.855,54	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	28,49	2,50	30,99	13.966,16	1.225,53	15.191,69	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M). EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	28,49	2,50	30,99	6.750,63	592,36	7.342,99	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	28,49	2,50	30,99	915,13	80,30	995,43	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	13.917,31	28,49	2,50	30,99	3.965,04	347,93	4.312,97	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	153.612,19	98,63	-	98,63	151.507,72	-	151.507,72	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	9.351,17	98,63	-	98,63	9.223,06	-	9.223,06	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.716,26	98,63	-	98,63	2.679,05	-	2.679,05	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 49,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		2.406.780,46	34,29	15,19	49,48	825.386,97	365.565,26	1.190.952,23
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8.472,45	98,63	-	98,63	8.356,38	-	8.356,38
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	75.140,48	98,63	-	98,63	74.111,06	-	74.111,06
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15.175,52	98,63	-	98,63	14.967,62	-	14.967,62
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	98,63	-	98,63	41.872,95	-	41.872,95
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	98,63	-	98,63	297,60	-	297,60
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2' M	17.948,70	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	16.734,94	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	233.476,16	50,00	35,15	85,15	116.738,09	82.066,86	198.804,95
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	50,00	35,15	85,15	4.191,97	2.946,95	7.138,92
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	50,00	35,15	85,15	5.868,75	4.125,73	9.994,48
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	50,00	35,15	85,15	44.804,55	31.497,60	76.302,15
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	50,00	35,15	85,15	3.210,43	2.256,93	5.467,36



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimentos LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
CNPJ 00.481.987/0001-03				Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 49,48%

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
				Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:									
1.2.9.5.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM. - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	2.406.780,46	34,29	15,19	49,48	825.386,97	365.655,26	1.190.952,23
		TOTAL:							
1.2.9.6.		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	96.712,85	50,00	35,15	85,15	46.356,43	33.994,56	82.350,99
			20.611,92	50,00	35,15	85,15	10.305,96	7.245,09	17.551,05

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
terça-feira, 22 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Execução
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 05 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 22 de Setembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		20200000000735	Data do Serviço
			09/10/2020	bf89c80de

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/10/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 05 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 255.895,68 Mão de obra R\$ 109.669,58 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 12.063,65 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.838,44 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	365.565,26	3,50	3.838,44	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	109.669,58	3.838,44	0,00	255.895,68		
Valor Total da NFS-e	365.565,26		Valor Líquido da NFS-e	349.663,17			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4342,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$14750,56; Total Aprox: R\$19093,48. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$12.063,65	
--	---

Consulta realizada em 09/10/2020 às 14:29:54.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000735bf89c80de00481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11715 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13022 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	127.116,08	18.278,26	18.278,26

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 18.278,26**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946**
CONTRATO 0598385-07/19**710496**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal N° 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 11709 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13022 / 2019	4 / 2020	0 / 2019	127.116,08	3.534,75	3.534,75

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.534,75Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496
CONTRATO 0503385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 18 de setembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11716 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13023 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	2.279.664,38	347.287,00	331.384,91

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

12.063,65

218810109

ISS

3.838,44

Total Retenções:**15.902,09****TOTAL DA ORDEM: 331.384,91**

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946

710496

CONTRATO 0598385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13022 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 127.116,08	Saldo Anterior do Empenho 89.381,49	Valor Liquidado 3.534,75	Saldo Atual do Empenho 85.846,74

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	0,03	SERVIÇ	CENTRO 2	127.116,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	718	3.534,75	Outras Sér	28/08/2020

Valor Líquido a Pagar : 3.534,75

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 131/2020

Pitanga, 13 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	349.663,17		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		349.663,17	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Ofício nº 131/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 16/10/2020

TERMINAL: 1101

NSU: 000943

HORA: 14:56:30

AUT.: 0039

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 13/11/2020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000379

ção e Finanças

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

DEPOSITANTE:

P M DE PITANGA

**28 de Janeiro, nº 171, Centro
DES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

VALOR TOTAL: 349.663,17 R\$

DEBITO AUTORIZADO: 349.663,17 R\$

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Valor por Dívida

Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
3.838,44	NO.EX							

1ª Via - Via Cliente

Exercicio Dívida

SubDívida Parcela

Informação para Baixa

Data Vencimento

Valor a Pagar

Autenticação - via contribuinte

12000000000078299

13/11/2020

3.838,44

CEF19461610200400790000946

3.838,44RD1101



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 13/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	110	12	3.838,44	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - outubro/2020 NFS-e 202000000000735 Contrato nº 430/2019											

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000078299	13/11/2020	3.838,44

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 13/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	13/10/2020	Informação para Baixa	12000000000078299	Data de Vencimento	13/11/2020
Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	0,00
			3.838,44		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$		0,00	Valor Multa R\$	0,00
	Valor Desconto R\$		0,00	Valor a Pagar R\$	3.838,44


81600000038-9 | 38443362202-2 | 01113120000-5 | 00000078299-5

Autenticação Mecânica



N.ID: 00900020312871 COD. PAR: 2558 CNPJ: 102020


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	12.063,65
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	12.063,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CEF19461610200380784000947


12.063,65RD1101

CEF 19461610200380784000947 12.063,65RD1101

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	12.063,65
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	12.063,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8<

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	12.063,65
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	12.063,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CE REGOV/PG 3950/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos -Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 11:37 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 05, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 18.278,26 e de financiamento é de R\$ 347.287,00, totalizando R\$ 365.565,26.

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71049-6 a contrapartida financeira no valor de R\$ 18.278,26 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 28/08/2020.

2.4- Tendo em vista que o cronograma de desembolso venceu em 31/08/2020, solicitamos que o município nos envie a documentação solicitada dia 09/09/2020 através da CE 3761/2020 (em anexo), para procedermos com a alteração do prazo de desembolso. Após a alteração do cronograma e atendimento das demais pendências, efetuaremos o desembolso de recursos.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

1.1 - Ofício de solicitação de alteração contratual e aprovação técnica do setor competente do Tomador/Agente Promotor (modelo em anexo);

1.2 - Justificativa contendo as causas do não cumprimento do cronograma em vigor, informando as eventuais pendências quanto à conclusão de execução de obras e/ou serviços e outros fatores julgados relevantes e determinantes da alteração proposta;

1.3 - Novo cronograma físico-financeiro, incluindo as parcelas já executadas e a executar. Lembramos que a última parcela deve ser de no mínimo 3% do valor do financiamento;

1.4 - Novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já desembolsadas e a desembolsar (modelo em anexo). Incluir depois de 08/2020 as parcelas a desembolsar, de acordo com o novo cronograma físico-financeiro;

1.4.1 - Enfatizamos que não somente a obra deverá ser finalizada dentro do prazo a ser estipulado no novo cronograma de desembolso, o desembolso de recursos também deverá ocorrer dentro do prazo proposto. Sendo assim, sugerimos utilizar um prazo factível, visto que podem ocorrer imprevistos (fatores climáticos, pendências verificadas na vistoria a ser realizada pela CAIXA, dificuldade na apresentação do laudo de controle tecnológico, ausência de regularidade cadastral, etc) que impossibilitem a realização do desembolso em prazo exíguo.

2 - Alertamos que é condição indispensável para aprovação da proposta de alteração contratual, a adimplência do Tomador/Agente Promotor em relação à CAIXA e a regularidade com o FGTS.

3 - Por oportuno, comunicamos que haverá cobrança de tarifa de reprogramação de cronograma físico/financeiro no valor de R\$ 400,00, conforme Tabela de Tarifas CAIXA vigente para cada contrato.

3.1 - **Solicitamos informar em que data a referida tarifa poderá ser cobrada.** Depois de informada a data, enviaremos o documento de cobrança diretamente para a Agência CAIXA de vinculação. Solicitamos encaminhar a autorização para o débito diretamente para a Agência.

4 – Lembramos ainda que está em andamento uma reprogramação de itens de investimento dos contratos em referência. Iremos efetivar a reprogramação de engenharia bem como a alteração do prazo de desembolso num mesmo momento. Para tanto se faz necessário concluir a reprogramação das obras e ampliação do prazo de desembolso para que seja possível novo desembolso.

5 - A documentação poderá ser integralmente enviada por meio eletrônico, com a devida assinatura eletrônica nos documentos, cuja autenticidade e integridade possa ser comprovada por meio de Certificado Digital legalmente expedido por uma Autoridade Certificadora (AC) vinculada ao ICP-Brasil.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contratos de Financiamento nº : 0503366-72 – 0503380-57 – 0503385-07 e 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 - Considerando que o cronograma de desembolso do Contratos de Financiamento em referência previa o último desembolso em agosto/2020 e, considerando que os empreendimentos encontram-se em atraso, solicitamos a apresentação dos documentos abaixo relacionados para procedermos a **prorrogação do prazo de desembolso.**

mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



CE REGOVPG 37612020 - Solicita Documentação para Alteração de Cronograma - Pitanga
418.9kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503366-72.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503380-57.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503385-07.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0504251-16.doc
35.5kB



CronoDesembolso-0503366-72.xls
38.5kB



CronoDesembolso-0503380-57.xls
34kB



CronoDesembolso-0503385-07.xls
34.5kB



CronoDesembolso-0504251-16.xls
35kB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301134574477796

Informação obtida em 07/10/2020 09:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
